
مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	أمانة جدة	شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز — رقم المخطط: BLOCK11 — رقم الشارع : ROAD 04

استلام الطبقة : TOP SUB-GRADE — من محطة رقم :0+150 — الى محطة رقم :0+214

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :........ — التاريخ : 22/05/2024

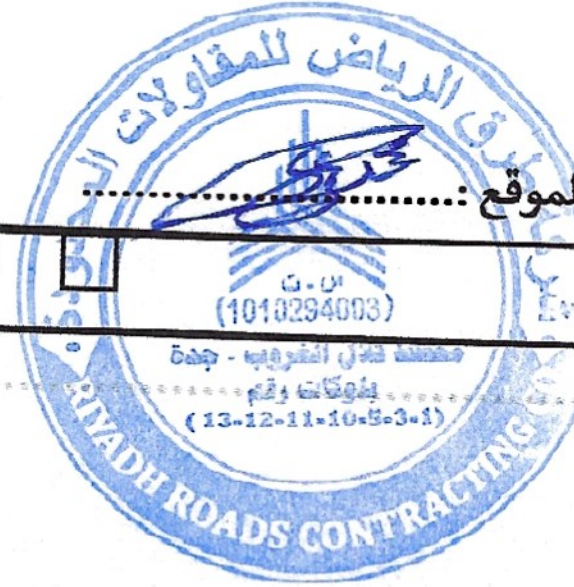

المراقب ☐ — المساح ☐ — المختبر ☐ — توقيع المهندس المشرف :.............................

مرئيات المراقبة :

جاهز ☑

غير جاهز ☐

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : .... — الي المحطه : ....

مرفقات : القطاع الطولي ☐ — القطاع العرضي ☐ — اخري ☐

متطابق ☑

غير متطابق ☐

ملاحظات : ....

التوقيع: — التاريخ : / /

من محطة : — الى محطة :

توقيع المساح : — التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد — مرفق ☐ — غير مرفق ☐ — قيمه البركتور : — الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات

النتيجه : ناجح ☐ — راسب ☐ — التوقيع : — التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

موافق ☑ — غير موافق ☐

التوقيع:

تم الاستلام : .... — مندوب المقاول : .... — التوقيع : .... — التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقـــرير إســـتلام طـبقــة ردم

ROAD-B11-4	رقم الشارع :-		تلال الغروب	
214 M	طول الشارع :-		BLOCK11	
22.200	عرض الشارع :-		TOP SUB-GRADE	
	WIDHT-R	11.100	LAYAER THICKNESS	0.120
	WIDHT-L	11.100	DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L		R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.15%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.15%		
				2.600	5.500	3.000	0.000	3.000	5.500	2.600		
13	150	528819.010	2370093.722	51.544	51.514	51.459	51.459	51.459	0.000	0.000	11.100	11.100
14	162.5	528830.549	2370088.915	51.452	51.422	51.367	51.367	51.367	0.000	0.000	11.100	11.100
15	175	528842.088	2370084.109	51.360	51.330	51.275	51.275	51.275	0.000	0.000	11.100	11.100
16	187.5	528853.627	2370079.302	51.269	51.239	51.184	51.184	51.184	0.000	0.000	11.100	11.100
17	200	528865.166	2370074.496	51.177	51.147	51.092	51.092	51.092	0.000	0.000	11.100	11.100
18	212.5	528876.705	2370069.689	51.200	51.170	51.115	51.115	51.115	0.000	0.000	11.100	11.100
19	214	528878.088	2370069.113	51.215	51.185	51.130	51.130	51.130	0.000	0.000	11.100	11.100

الإستشاري	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م حسين عبده	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-



BLOCK 11

اتجاة تصريف المياة
الأرض الطبيعية
الخط التصميمي
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

أمانة جدة

المالك/ وزارة الاسكان

وزارة الإسكان

المطور/ شركة ساني العامرية

شركة ساني العامرية SANY Alameriah Co.

الاستشاري العام / الأبنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للاستشارات الهندسية Abnia Consulting Engineers
Architects . Planners . Engineers

الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع ظلال الغروب
بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:
مقياس الرسم: 1:500 1:500

NO.
PLAN

مدير عام الدراسات والتصاميم
مديرإدارة تصميم الطرق

شـــــــارع عـــــرض ٢٧٫٠٠ متر

238 53.01	237 52.18	236 51.27	235 50.46		
239 52.94	240 52.26	241 51.49	242 50.81		
246 52.94	245 52.26	244 51.49	243 50.81		
247 52.81	248 52.32	249 51.64	250 51.15		
255 52.81	253 52.32	252 51.64	251 51.15		
255 52.81	256 52.42	257 51.99	258 51.60		

RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
